Naturstyrelsen, Kloakering af Nørrevangen - Rødovre **REV: 12** **Dato: 16-05-2023**

Spildevand og dræn ledninger

Måned			Procent færdig :		
Uge			SPV H:	SPV Stik:	Dræn:
Mobiliseringsperiode, inkl etablering af byggeplads	**Husnr.**				
Hold 1					
Stikkelbærstien - Fællesplads	25-27	PST-S2	100%	100%	
Morbærstien VEST - Mod Hindbærstien	26-47 + Hindbærstien 7	PST-S2	100%	100%	
Stien mellem Mørbærstien og Hyldebærstien		PST-S2	100%	100%	
Hyldebærstien VEST - Mod Hindbærstien	25-39 + Hindbærstien 11	PST-S2	100%	100%	
Hyldebærstien MIDT - Mod Blåbærstien	15-24	PST-S2	100%		
Stien mellem Hyldebærstien og Blåbærstien		PST-S2	100%	100%	
Blåbærstien - NORD VEST	29-35 + Hindbærstien 15	PST-S2	100%	100%	
Stikkelbærstien - VEST	24-53 + Hindbærstien 3	PST-S2	100%		
Stikkelbærstien - MIDT	16-23	PST-S2			
Vej mellem Stikkelbærstien og Solbærstien		PST-S2	100%	100%	
Solbærstien VEST	16-65	PST-S2	20%	100%	
Brovej mellem Solbærstien og Nordstien		PST-S2	100%		
Nordstien Øst - Mulig styret boring	2-24	PST-S2			
Del-aflevering Spildevand system for PST-S2 Pumpebrønd					
Brovej mellem Bakkestien og Højdestien og Solstien		PST-S3	100%		
Bakkestien ØST - Mulig styret boring	1-29	PST-S3		5%	
Bakkestien Fællesplads	28-30	PST-S3			
Hold 2					
Blåbærstien ØST	1	PST-S1	100%		
Blåbærstien NORD ØST	3-27	PST-S1	100%		
Hyldebærstien ØST	1-14	PST-S1		100%	
Morbærstien ØST	1-24	PST-S1	100%	100%	
Stikkelbærstien ØST	1-14	PST-S1		10%	
Solbærstien ØST	1-15	PST-S1		100%	
Solbærstien til Elmestien - SKAL Styret boring X 2 ledninger - 1. boring.		PST-S1	25%		
Elmestien	1-14	PST-S1		95%	
Poppelsetien mellem Elmestien og Egestien		PST-S1			
Egestien ØST	9-14	PST-S1		100%	
Del-aflevering Spildevand system for PST-S1 Pumpebrønd					
Brovej - MOD Bakkestien	4 grunde	PST-S3	100%	50%	
Åstien ØST	2-34	PST-S3	100%	100%	
Poppelstien	1-15 + Birkestien 14	PST-S3	5%	100%	
Birkestien	1-13	PST-S3		100%	
Højdestien ØST - Mulig styret boring	1-20	PST-S3			
Solstien ØST - Mulig styret boring	1-15	PST-S3		100%	
Del-aflevering Spildevand system for PST-S3 Pumpebrønd					
Hold 3					
Veststien	2-58	PST-S4	100%	95%	30%
Bakkestien VEST	31-58	PST-S4	100%	100%	
Åstien VEST	36-55	PST-S4	100%	100%	
Åstien fra SYD til NORD - Op til Nordstien	Veststien 1	PST-S4	100%	100%	10%
Højdestien VEST - Mulig styret boring, del strækning	21-58	PST-S4			
Del-aflevering Spildevand system for PST-S4 Pumpebrønd					
Nordstien til Solstien - SKAL Styret boring - 2. styret boring					
Solstien VEST - Mulig styret boring	17-57	PST-S5		65%	
Nordstien VEST	25-53	PST-S5		45%	
Del-aflevering Spildevand system for PST-S5 Pumpebrønd					
Bøgestien	1-14	PST-S3		100%	
Egestien VEST	1-7	PST-S3		95%	
Del-aflevering for komplet dræn system.					
Mangel gennemgang og udbedringsperiode					
Afsluttende arbejder og aflevering					

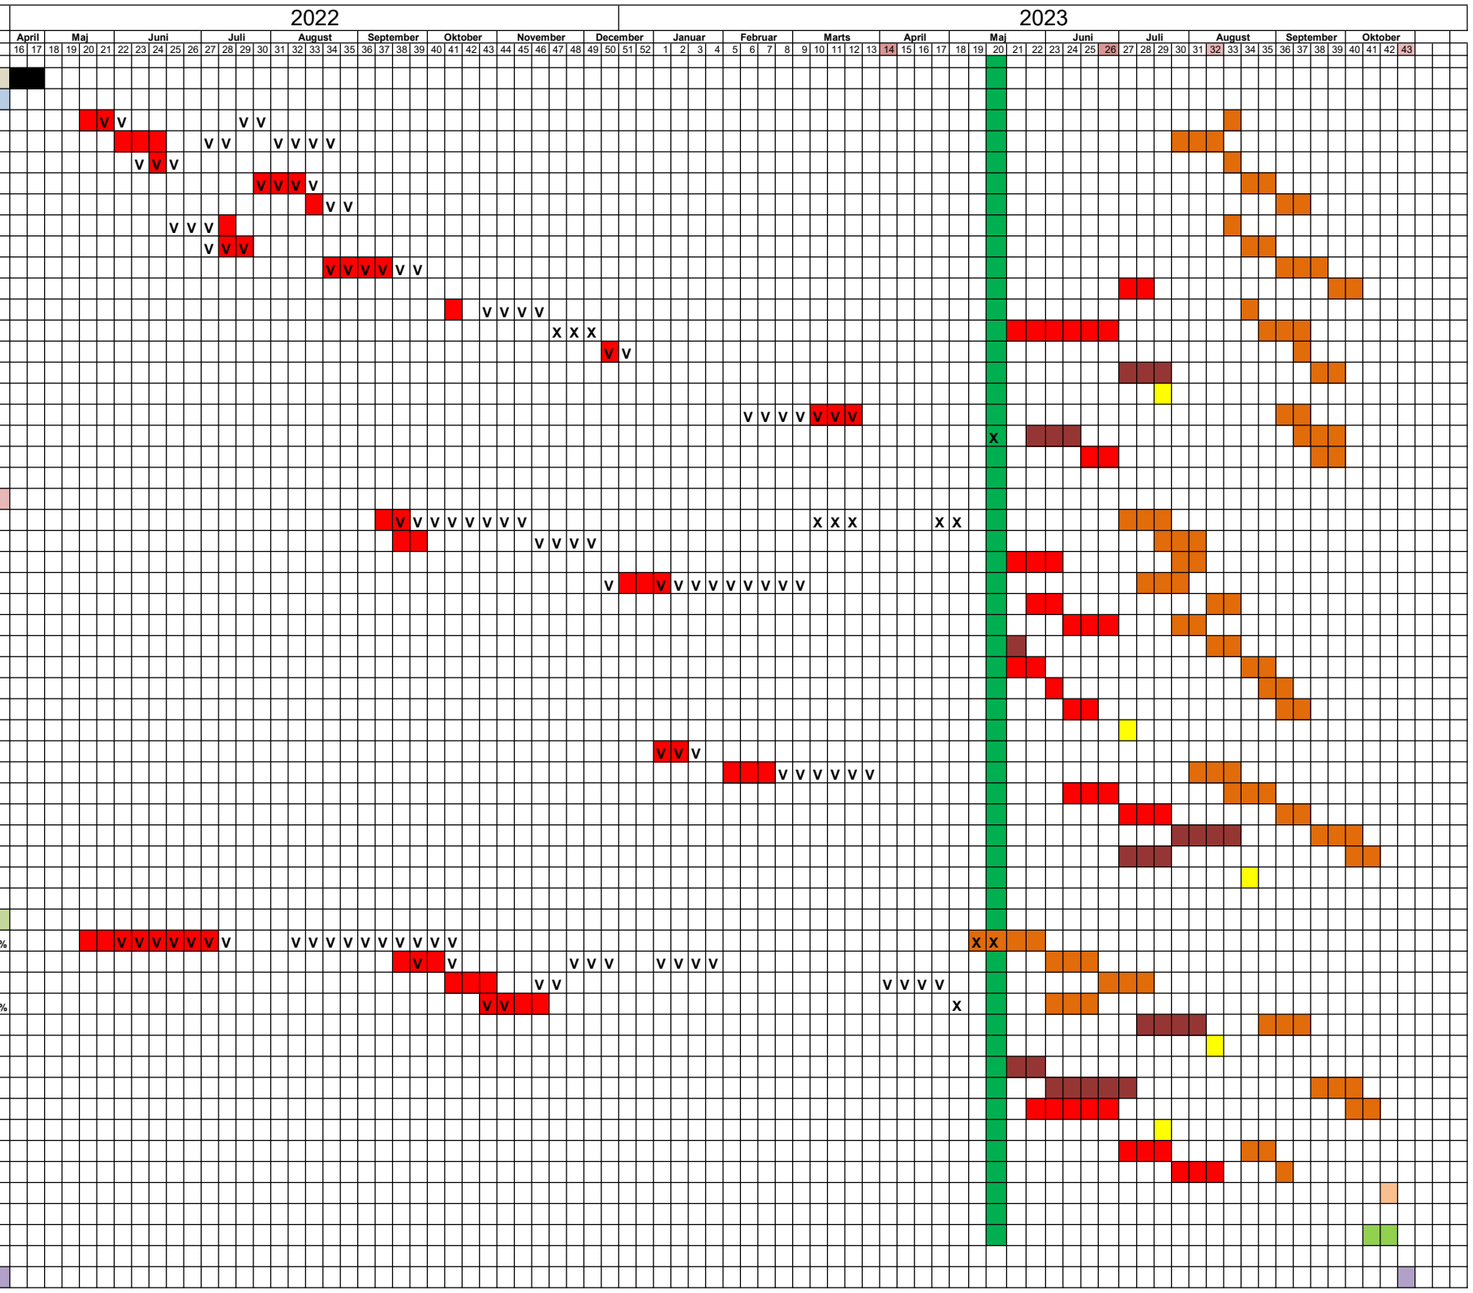

Pumpebrønd levering
Uge 20 / 21

= Spildevands-ledninger

= Drænledninger - Opbygning af vejkasse.

X = Udførelses-fase

V = Færdig udført
