Dato: 26-06-2023 **REV:** 1-VAND

Drikkevand

Måned		Procent færdig:	
Uge		Hovedl.	Brønde:
Hold 4			
Morbærstien VEST - Mod Hindbærstien	26-47 + Hindbærstien 7	100%	90%
Hyldebærstien VEST - Mod Hindbærstien	25-39 + Hindbærstien 11	100%	
Hyldebærstien MIDT - Mod Blåbærstien	15-24	100%	
Blåbærstien - NORD VEST	29-35 + Hindbærstien 15	100%	100%
Stikkelbærstien - VEST	24-53 + Hindbærstien 3	100%	
Stikkelbærstien - MIDT	16-23		
Solbærstien VEST	16-65	20%	98%
Brovej mellem Solbærstien og Nordstien		100%	
Nordstien Øst	2-24		100%
Brovej mellem Bakkestien og Højdestien	3 stik	100%	
Bakkestien ØST	1-29	100%	10%
Bakkestien Fællesplads	28-30		
Blåbærstien ØST	1	60%	
Blåbærstien NORD ØST	3-27	100%	
Hyldebærstien ØST	1-14		100%
Morbærstien ØST	1-24		100%
Stikkelbærstien ØST	1-14		35%
Solbærstien ØST	1-15	25%	100%
Elmestien	1-14	90%	95%
Egestien ØST	9-14	100%	100%
Hold 5			
Brovej - MOD Bakkestien	4 stik	100%	50%
Åstien ØST	2-34	100%	100%
Poppelstien	1-15 + Birkestien 14		100%
Birkestien	1-13	90%	100%
Højdestien ØST	1-20	100%	
Solstien ØST	1-15	95%	100%
Veststien	2-58	95%	95%
Bakkestien VEST	31-58	100%	100%
Åstien VEST	36-55	100%	100%
Åstien fra SYD til NORD - Mellem Solstien og Højdestien	58	100%	100%
Højdestien VEST	21-58	100%	
Solstien VEST	17-57	95%	100%
Nordstien VEST	25-53		95%
Bøgestien	1-14	95%	100%
Egestien VEST	1-7	90%	90%
Mangel gennemgang og udbedringsperiode			
Afsluttende arbejder og aflevering			

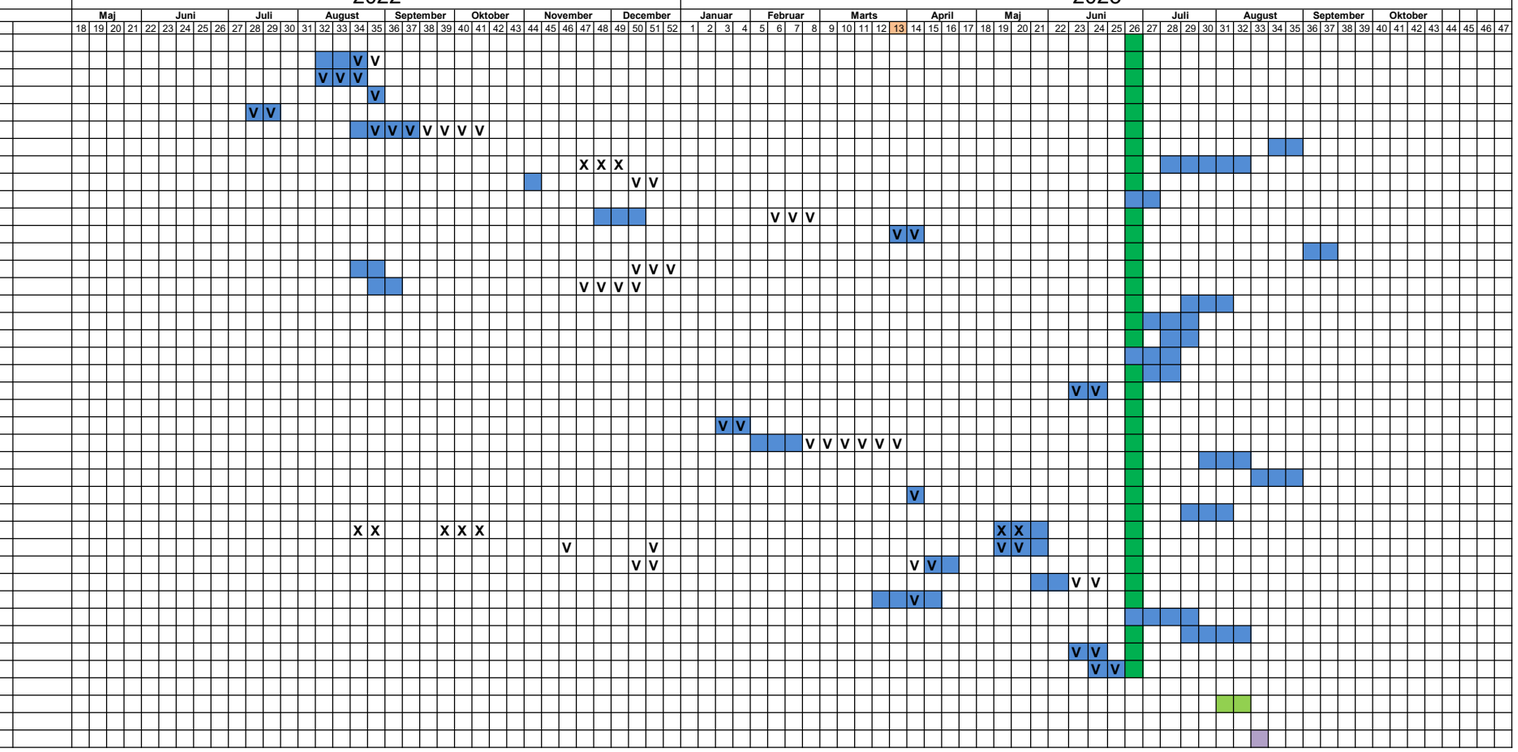

	=	Drikkevandsledninger
X	=	Udførelses-fase
V	=	Færdig udført
